



## 附件一(A)

### C2C 海纜系統 (C2C) 區段 2B 海纜故障維修作業範圍略圖

1. 故障地點：經初步量測判定故障點約位於屏東縣枋山鄉西方外海約 9 公里處，其位置為：22° 13.581' N；120° 35.277' E（水深約為 170 公尺）
2. 維修作業區域：詳如下列（作業範圍將於確定故障位置後縮小調整）
3. 作業期間：自民國 111 年 09 月 27 日起至民國 111 年 11 月 30 日止（實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及新冠肺炎疫情狀況而調整）
4. 維修作業船舶：堅定號 (CS RESOLUTE)



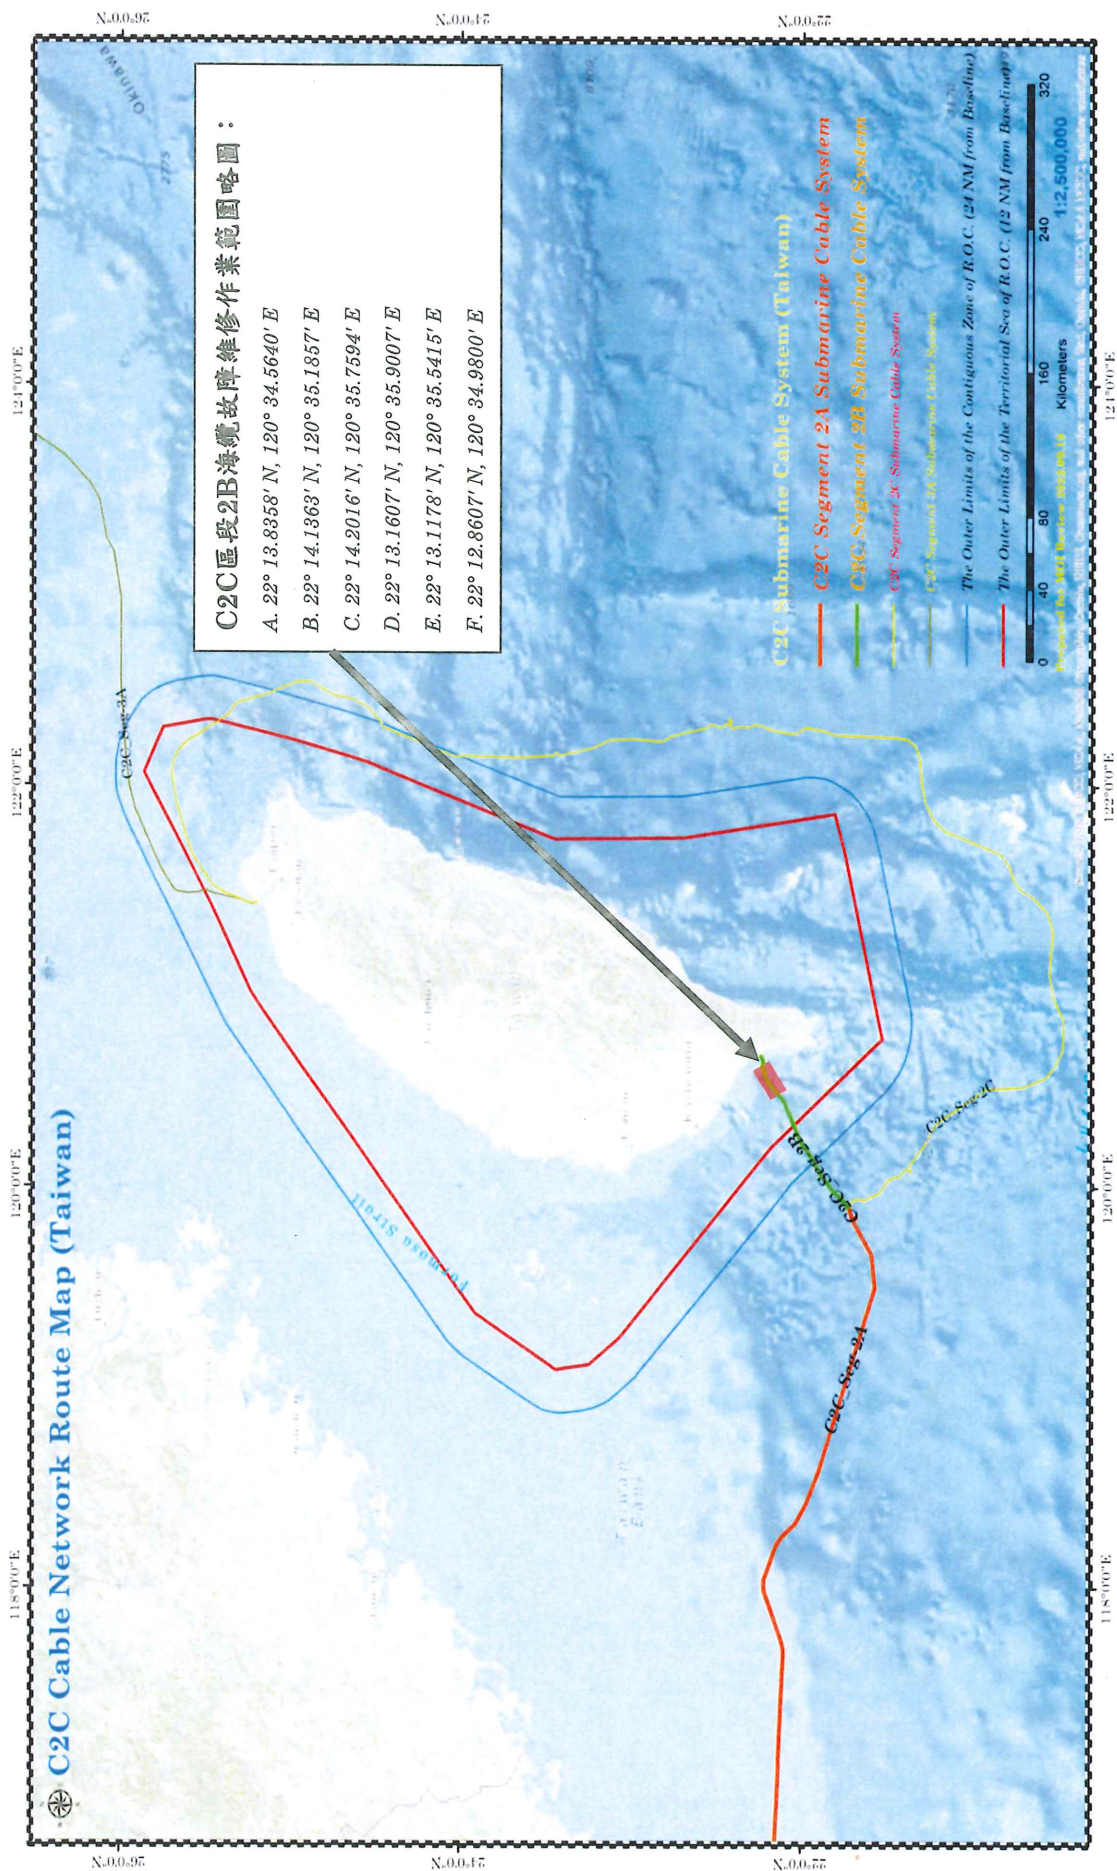

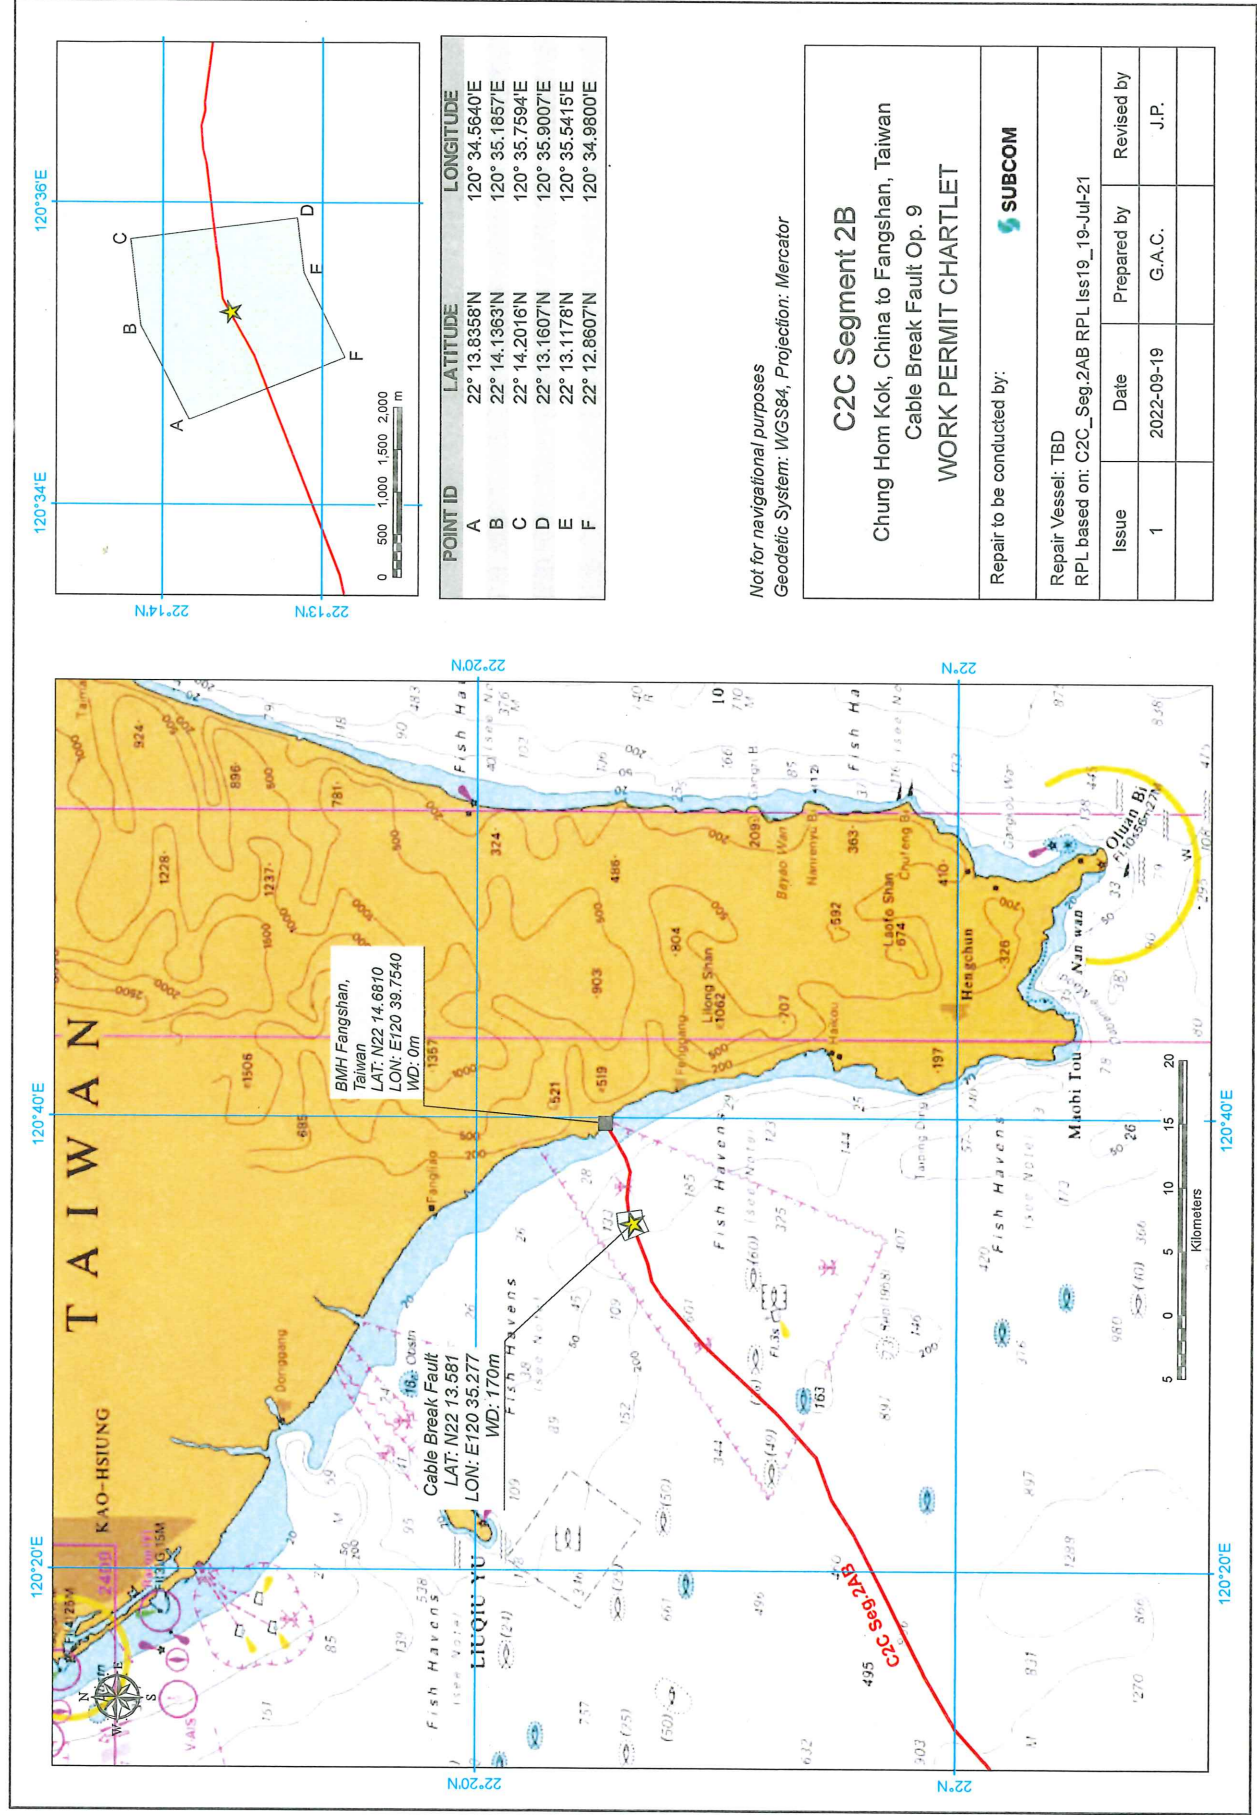

**附件二：C2C 海纜系統（C2C）區段 2B 障搶修時間表（含時間、作業內容）**

**作業海域：**屏東縣枋山鄉西方外海

**作業船舶：**堅定號（CS RESOLUTE）

編號	作業時間	作業內容
1	2022/09/19   2022/09/27	收到海纜維修通知； 作業許可申請； 海纜船作業前置準備工作。
2	2022/09/27	前往維修海域； 以水下載具 ROV 進行尋找故障位置； 撈鉤與海纜切斷作業。
3	2022/09/28   2022/09/30	撈起第一端海纜，開始測試作業； 確認海纜障礙位置； 海纜端末處理、準備海纜初始接續作業。
4	2022/10/01	海纜初始接續與測試作業。
5	2022/10/02	接續後海纜佈放作業； 海纜端末處理、準備海纜最終接續作業。
6	2022/10/03	海纜最終接續與測試作業。
7	2022/10/04	水下載具 ROV 準備進行 PLIB 作業。
8	2022/10/05	海事備用時間
9	2022/10/06	離開作業海域；維修任務結束。

**備註：**

上列作業時間及作業內容供參考（實際作業期間將隨故障情況、修理進度、當時海象及新冠肺炎疫情狀況而調整）



### 附件三（2）：堅定號(CS RESOLUTE)海纜船船舶照片及規格資料

主要規格：140 m（長）21 m（寬）12.6 m（深）12,184 ton（總噸位）3,655 ton（淨噸位）

船 級：特殊儀裝佈纜船（Cable Ship） 國 籍：馬紹爾群島籍（Marshall Island）

AIS 系統：MMSI no 538001923 & IMO no 9242340 船 呼（Call Sign）：V7FF3

