

「全國水環境改善計畫」

【高雄市茄苳區興達漁港水環境改善計畫】

整體計畫工作計畫書

申請執行機關：高雄市政府

中華民國一〇六年八月

目 錄

一、	整體計畫位置及範圍	1
二、	現況環境概述	1
三、	前置作業辦理進度	3
四、	工程概要	4
五、	計畫經費	5
六、	計畫期程	6
七、	預期成果及後續維護管理計畫	6
八、	其他事項	7

圖目錄

圖 1 計畫位置	1
圖 2 計畫範圍	1
圖 3 計畫位置周邊景點	2
圖 4 茄萣海岸線	2
圖 5 茄萣濕地公園	2
圖 6 興達港情人碼頭	3
圖 7 興達港海上劇場-1	3
圖 8 興達港海上劇場-2	3
圖 9 興達港海景餐庭	3
圖 10 大發路觀光魚市	3
圖 11 本計畫工程構想	5

表目錄

表 1 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫明細表	5
表 2 計畫經費	5
表 3 計畫期程(甘特圖)	6

附錄目錄

附錄一、工作明細表
附錄二、自主檢查表
附錄三、計畫評分表
附錄四、水利工程生態檢核自評表

一、 整體計畫位置及範圍：

本計畫坐落位置為高雄市茄萣區興達漁港，其計畫範圍為該漁港沿近海泊區臨大發路觀光魚市場之碼頭及閒置綠地，如下圖所示。

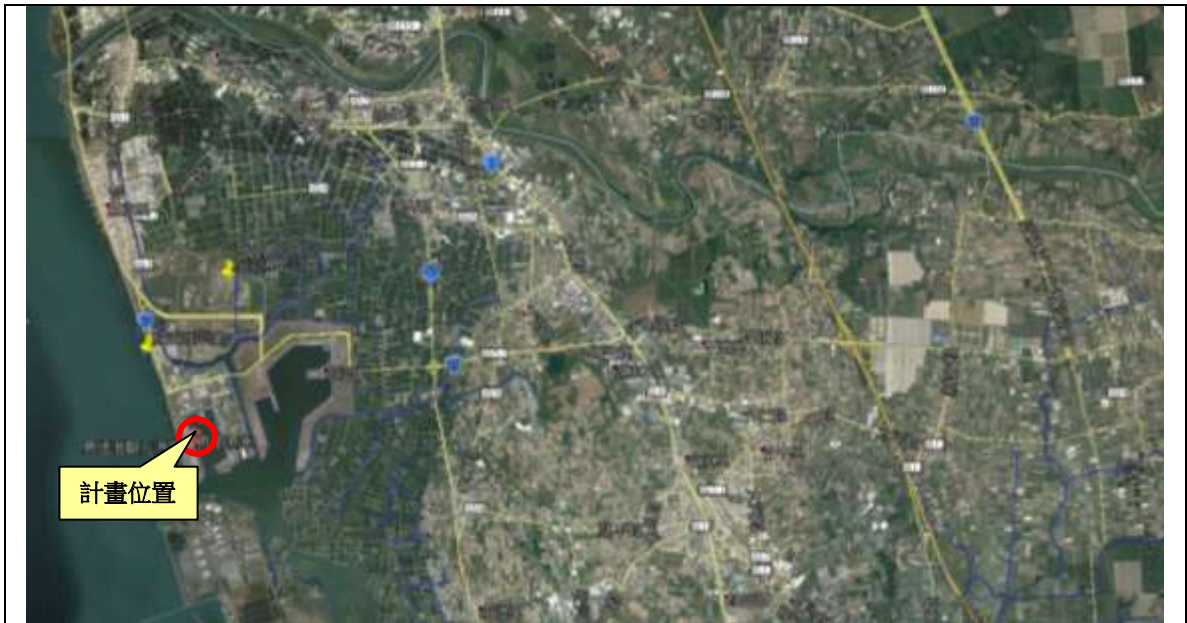


圖 1 計畫位置



圖 2 計畫範圍

二、 現況環境概述：(說明鄰近重要景點及社經環境說明)

本案工程北側有茄萣濕地公園及茄萣海岸線，東側有興達漁港(情人碼頭、海上劇場、生態公園等)，且緊臨大發路觀光魚市場，該觀光

魚市場主要以販售海鮮及海鮮料理，故有諸多遊客至周邊景點觀光後，會選擇至大發路觀光魚市場用餐及休憩，致該處遊客眾多，惟該處欠缺舒適之休憩設施。



圖 4 茄萣海岸線



圖 5 茄萣濕地公園



圖 6 興達港情人碼頭



圖 7 興達港海上劇場 1



圖 8 興達港海上劇場 2



圖 9 興達港海景餐庭



圖 10 大發路觀光魚市

三、前置作業辦理進度：

(一)府內審查會議之建議事項：無

(二)規劃設計進度：

本案計畫陳報同時辦理規劃設計及監造服務之勞務採購，惟需俟計畫核定後辦理採購決標訂約，訂約後 30 日曆天內完成細部設計，並送相關機

關及單位審查，以利本案計畫工程可於 106 年度完成工程採購發包作業。

(三) 用地取得情形：本案用地均為市有地，用地無取得問題。

(四) 生態檢核辦理情形：如后附件。

(五) 召開工作說明會或公聽會等公民參與情形：

本案計畫於 106 年 8 月 27 日邀集茄荳區公所、興達港區漁會辦理工作說明會。

四、工程概要：

(一) 整體計畫願景(具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。)

一、計畫動機

本次計畫申請位置因臨近茄荳海岸線、茄荳濕地公園、興達漁港(情人碼頭)等景點，故常有遊客遊憩後，至魚市場購物飲食，且常至本計畫提報處休憩飲食及觀看海景，惟該處欠缺舒適、安全及娛樂性之休憩設施，倘能於該處設置舒適、安全及娛樂性之休憩設施，將可使到訪之民眾獲得更優質的休憩空間。

二、計畫目的

1. 改善漁港周邊海岸景觀，提供更舒適及安全的休憩環境。
2. 串聯漁港週邊既有觀光及休憩景地(茄荳海岸線、茄荳濕地生態公園、興達漁港(情人碼頭、海景餐庭)、大發路觀光魚市場等)，使興達漁港多元發展。
3. 提供民眾親水的優質環境。

三、願景目標

1. 促進地方漁業及觀光產業之發展。
2. 讓民眾親近海洋、認識海洋，進而保護海洋。
3. 提升民眾對政府興辦公共工程效益之認同感。

(二) 規劃構想圖

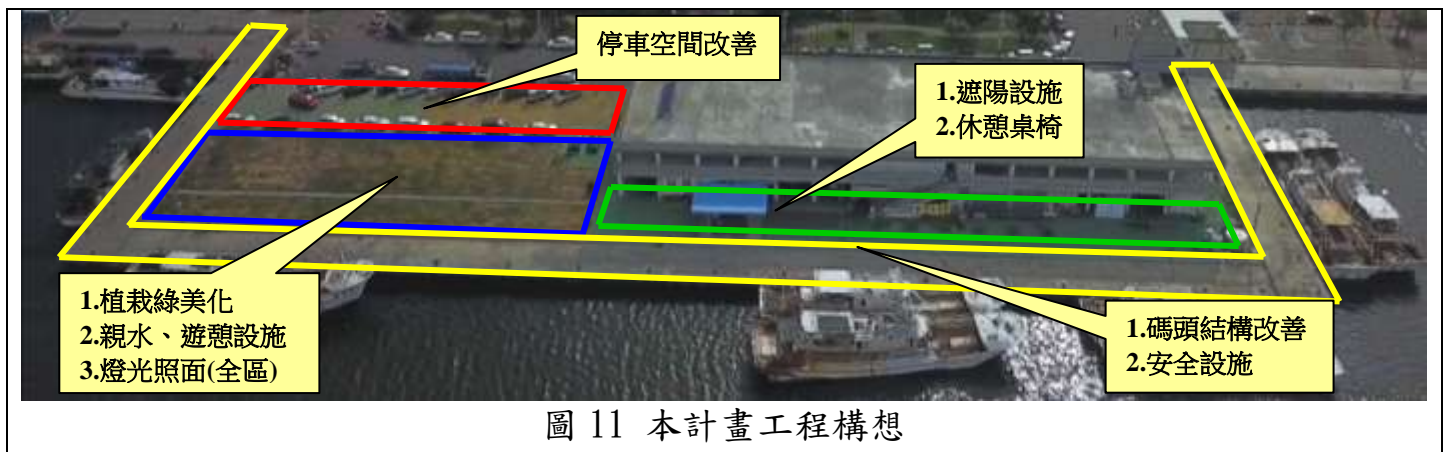


圖 11 本計畫工程構想

(三)分項工程項目(針對各工程分段敘述執行內容)

本計畫目前僅為單一個案工程。

表 1 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫明細表

計畫名稱	項次	分項工程名稱	主要工程項目	對應部會
高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫	1	興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程	1. 碼頭周邊環境改善(增設親水設施、休憩涼亭、座椅、夜間照明、植栽綠化等)。 2. 碼頭設施改善。	漁業署

五、計畫經費：本計畫僅單一個案工程

表 2 計畫經費

項次	分項工程名稱	對應部會	經費(千元)								
			106 年度		107 年度		小計	後續年度		總計	
			中央補助款	地方分擔款	中央補助款	地方分擔款		中央補助款	地方分擔款	中央補助款	地方分擔款
1	興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程	漁業署	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0
總計			80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0

六、計畫期程：

表 3 計畫期程(甘特圖)

興達港碼頭水岸環境及親水設施營造工程														
作業項目	開始時間	106 年					107 年							
	所需時間	9~12 月		1~3 月			4~6 月		7~9 月		10~12 月			
設計作業 (含勞務發包)	106.09.1	■												
	45 天													
預算及設計書 圖送審、核備	106.10.15		■											
	30 天													
工程招標 及訂約	106.11.15			■										
	45 天													
施工前作業	107.1.1					■								
	15 天													
工程施工	107.1.15						■	■	■	■	■	■	■	■
	300 天													
完工驗收	107.10.15												■	
	30 天													
決算結案	107.11.15													■
	30 天													

七、預期成果及後續維護管理計畫：

(一)預期成果

1. 碼頭結構改善約 250 公尺。
2. 遮陽設施增設約 200 平方公尺。
3. 休憩桌椅約 20 座。
4. 燈光照面面積約 2,500 平方公尺。
5. 親水遊憩設施 2 座。
6. 當地意象設施 2 座。
7. 綠美化面積約 1,000 平方公尺。
8. 停車空間改善約 750 平方公尺。

(二)後續維護管理計畫

1. 本局於興達漁港有設置管理站(編制 4 名人員)，可就近瞭解使用情形及管理。
2. 就現場環境維護作業，本局每年均有辦理漁港清潔作業之勞務採購，可由

清潔公司維護現場環境，另當地漁會議亦會派員協助管理及清潔。

3. 就硬體設備維護經費部分，本局每年均有編列漁港維護及修繕費用，足以辦理設備養(維)護及保養作業。

八、其他事項：

(一)計畫位置空拍圖

